






N°	Nom de la tâche	Lot	Durée	Début	Fin																												
						Novembre							Décembre							Janvier							Février				Mars		
						10/10	17/10	24/10	31/10	07/11	14/11	21/11	28/11	05/12	12/12	19/12	26/12	02/01	09/01	16/01	23/01	30/01	06/02	13/02	20/02	27/02	06/03	13/03	20/03				
110	Restauration des luminaires	Lot 18	3 mois	Lun 05/12/16	Ven 24/02/17																												
111	Repose	Lot 18	2 sm	Lun 16/10/17	Ven 27/10/17																												
112																																	
113	<b>Refection de la cour</b>		<b>45 jours</b>	<b>Lun 17/07/17</b>	<b>Ven 15/09/17</b>																												
114	Refection de sols en pavés cour	Lot 5	30 jours	Lun 17/07/17	Ven 25/08/17																												
115	Canalisation tout à l'égout	Lot 4	7 jours	Lun 31/07/17	Mar 08/08/17																												
116	Automatisation porte cochère	Lot 7	5 jours	Lun 31/07/17	Ven 04/08/17																												
117	Refection de sols en pavés côté jardin	Lot 5	15 jours	Lun 28/08/17	Ven 15/09/17																												
118																																	
119	<b>Bureaux RDC</b>		<b>100 jours</b>	<b>Lun 06/03/17</b>	<b>Ven 21/07/17</b>																												
120	Repose des menuiseries restaurées		2 sm	Lun 06/03/17	Ven 17/03/17																												
121	Peinture des menuiseries restaurées		2 sm	Lun 20/03/17	Ven 31/03/17																												
122	Fin de passage des réseaux		0 jour	Ven 12/05/17	Ven 12/05/17																												
123	Coffrages et cloisonnement		2 sm	Lun 15/05/17	Ven 26/05/17																												
124	Menuiseries intérieures		2 sm	Lun 15/05/17	Ven 26/05/17																												
125	Pose carrelage et faïence		2 sm	Lun 15/05/17	Ven 26/05/17																												
126	Mise en peinture des coffrages et cloisonnement		2 sm	Lun 29/05/17	Ven 09/06/17																												
127	Pose des terminaux CFA/CFO - Plomberie - Clim		2 sm	Lun 29/05/17	Ven 09/06/17																												
128	Repose et restauration du parquet		3 sm	Lun 12/06/17	Ven 30/06/17																												
129	Restauration des décors peints		2 mois	Lun 29/05/17	Ven 21/07/17																												


Projet : Planning M  
Date : Mer 26/10/1

Tâche		Lot 2		Lot 5		Lot 8		Lot 12		Lot 15		Lot 18		Lots 21/22	
Récapitulative		Lot 3		Lot 6		Lot 9		Lot 13		Lot 16		Lot 19			
Lot 1		Lot 4		Lot 7		Lots 10/11		Lot 14		Lot 17		Lot 20			


Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Septembre				Octobre				Novembre				Déc				
20/03	27/03	03/04	10/04	17/04	24/04	01/05	08/05	15/05	22/05	29/05	05/06	12/06	19/06	26/06	03/07	10/07	17/07	24/07	31/07	07/08	14/08	21/08	28/08	04/09	11/09	18/09	25/09	02/10	09/10	16/10	23/10	30/10	06/11	13/11	20/11	27/11

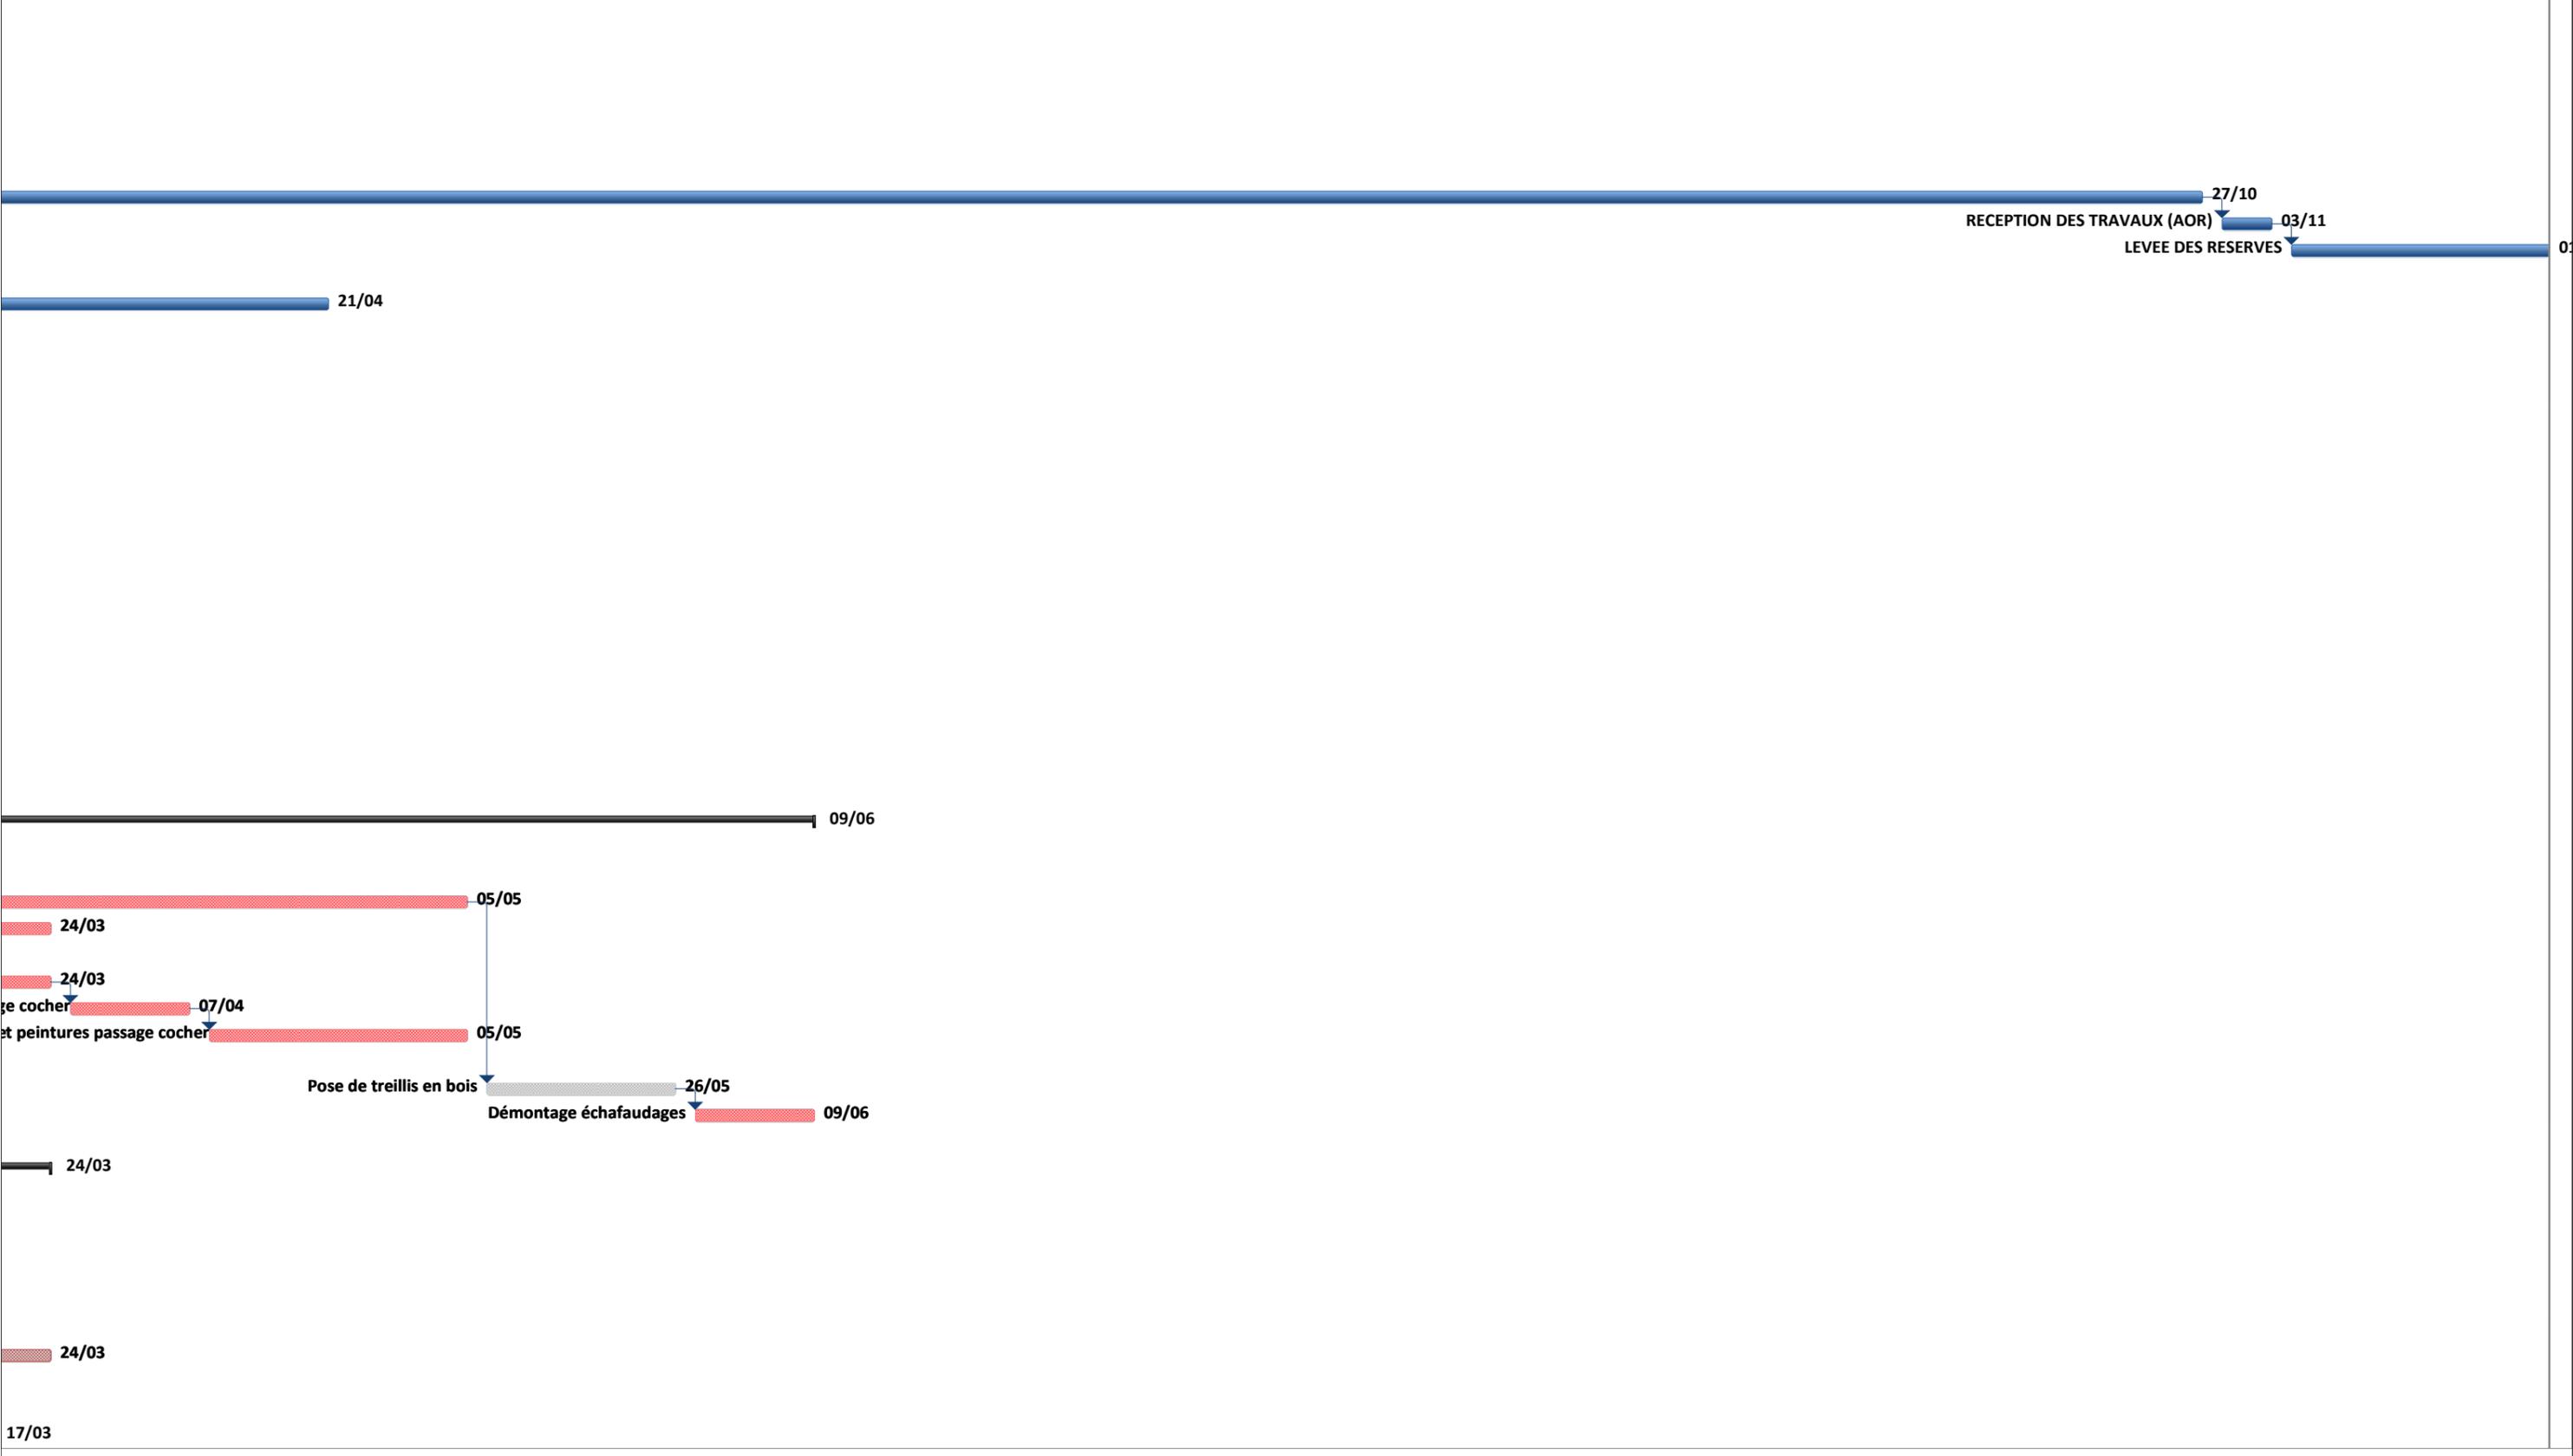

Projet : Planning M Date : Mer 26/10/1	Tâche	Lot 2	Lot 5	Lot 8	Lot 12	Lot 15	Lot 18	Lots 21/22	
	Récapitulative	Lot 3	Lot 6	Lot 9	Lot 13	Lot 16	Lot 19		
	Lot 1	Lot 4	Lot 7	Lots 10/11	Lot 14	Lot 17	Lot 20		

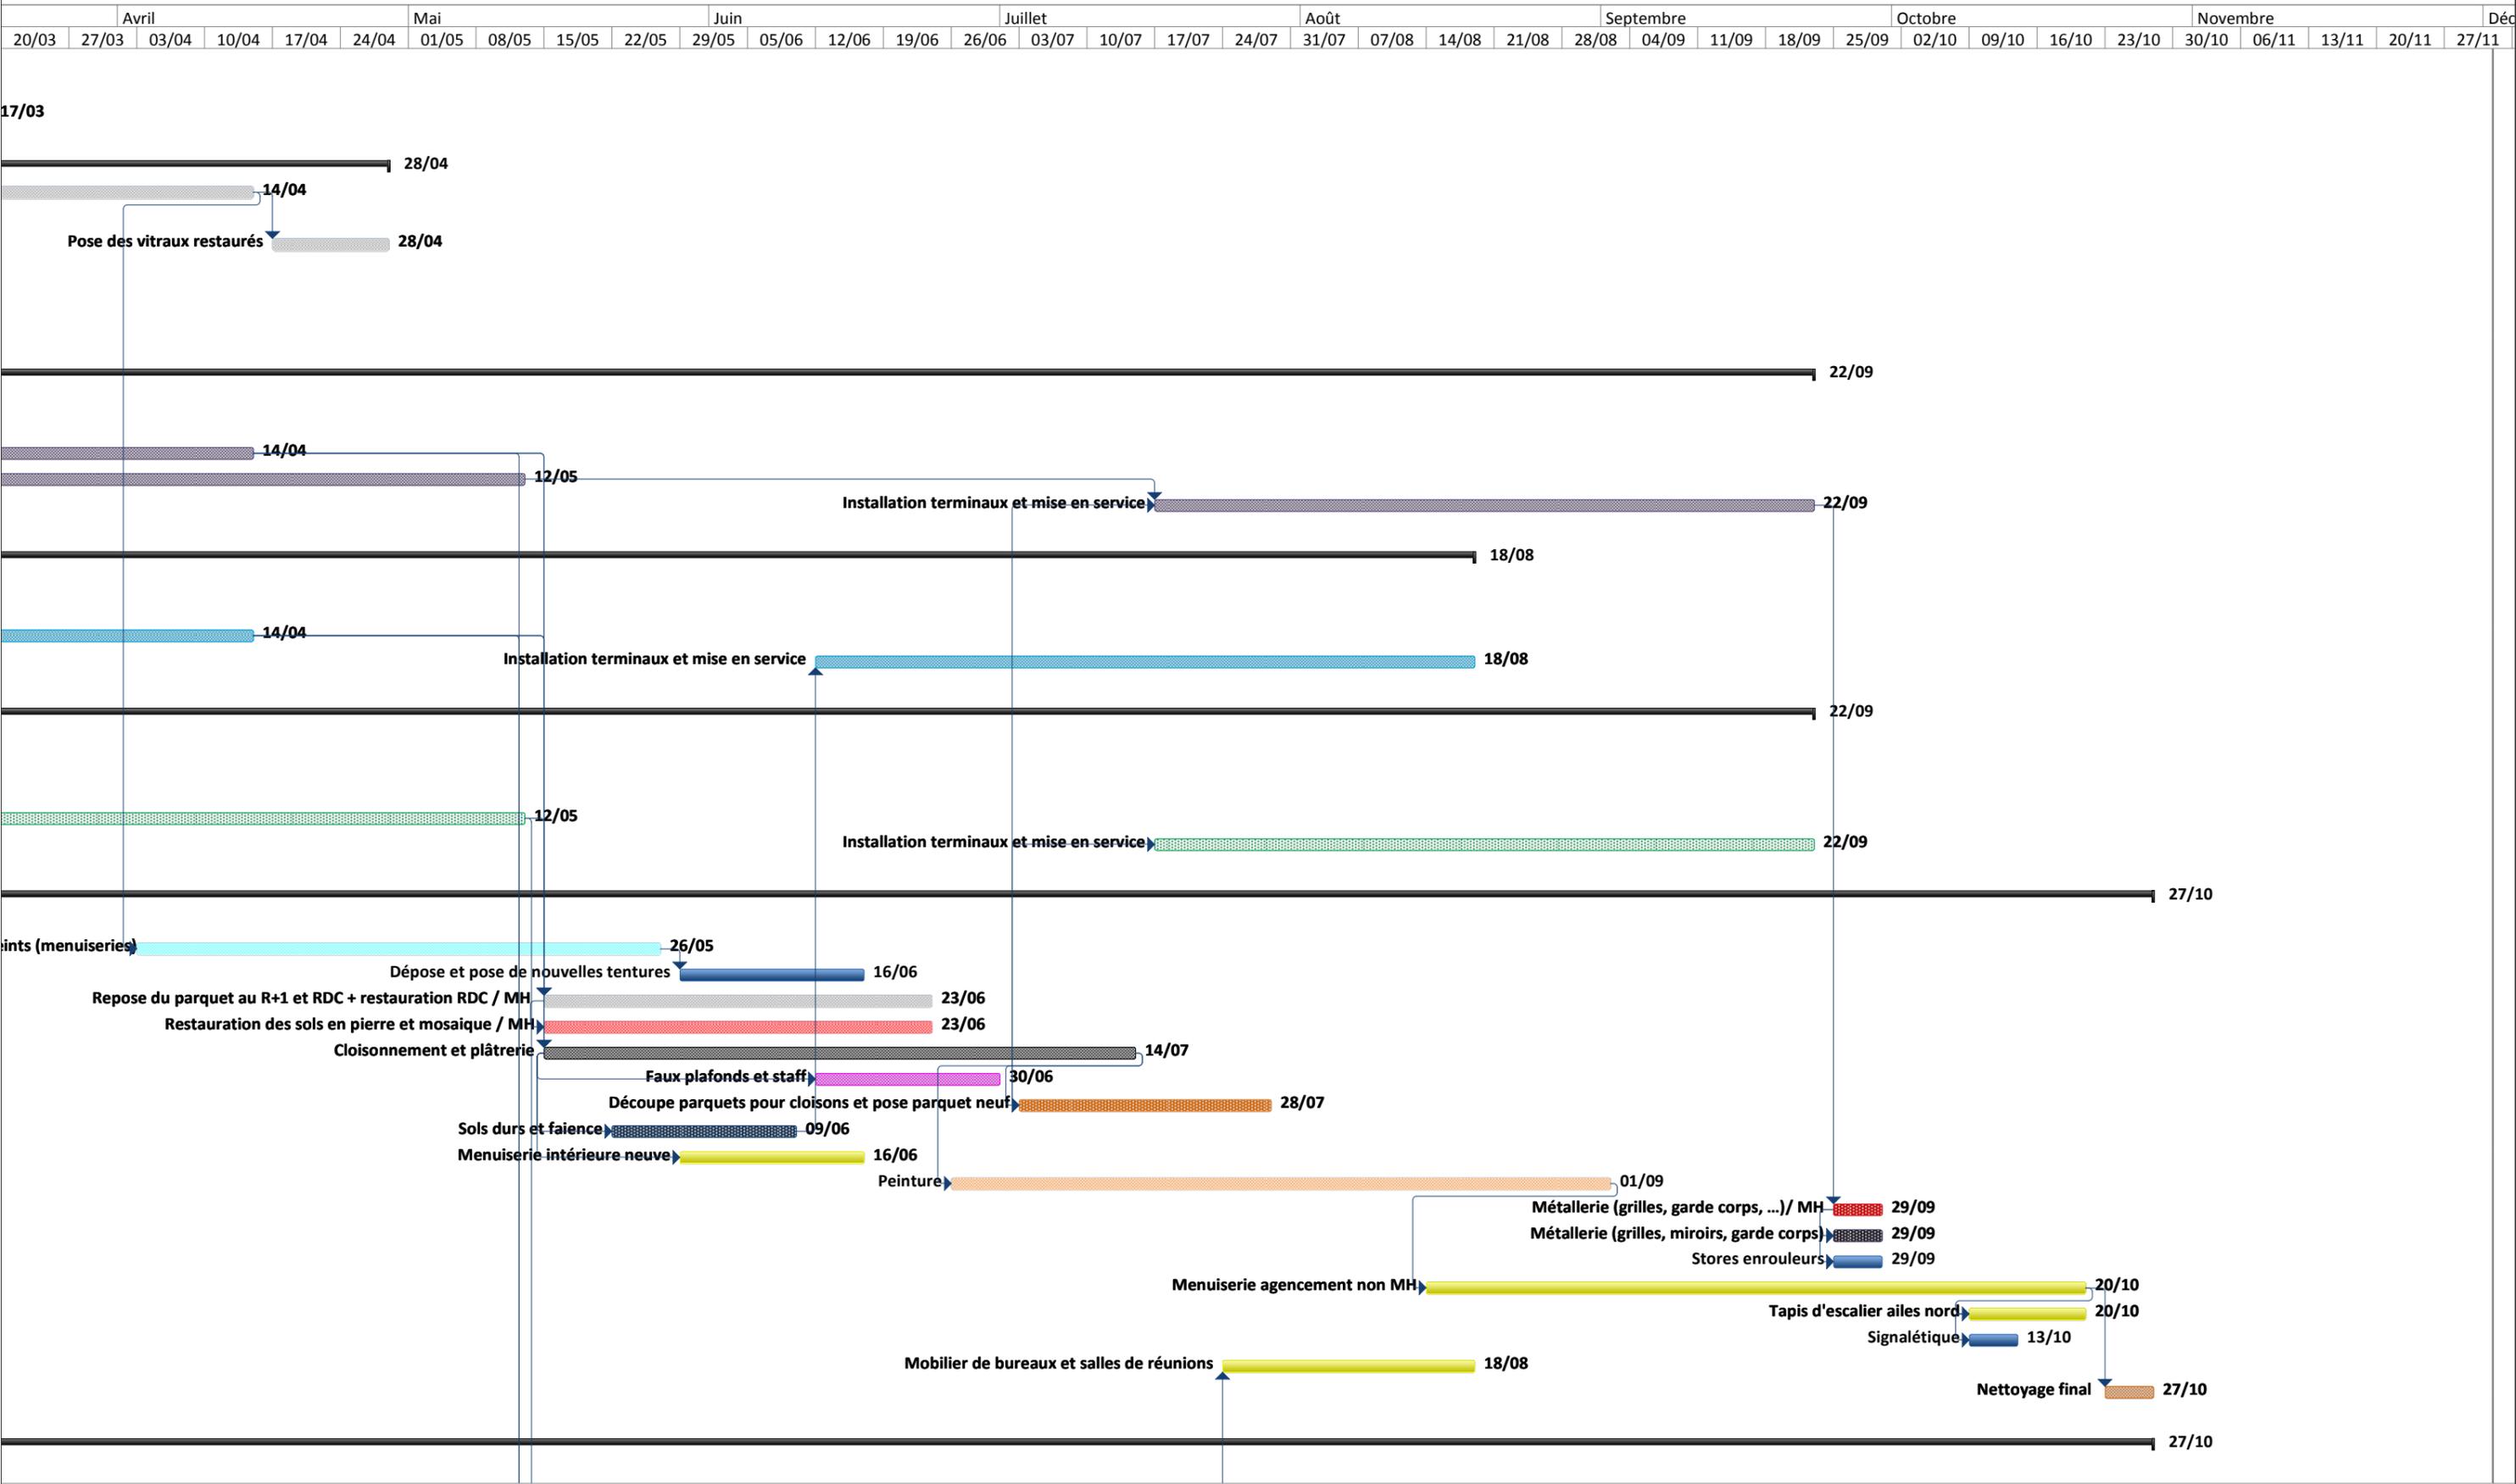

Projet : Planning M	Tâche	Lot 2	Lot 5	Lot 8	Lot 12	Lot 15	Lot 18	Lots 21/22
Date : Mer 26/10/1	Récapitulative	Lot 3	Lot 6	Lot 9	Lot 13	Lot 16	Lot 19	
	Lot 1	Lot 4	Lot 7	Lots 10/11	Lot 14	Lot 17	Lot 20	

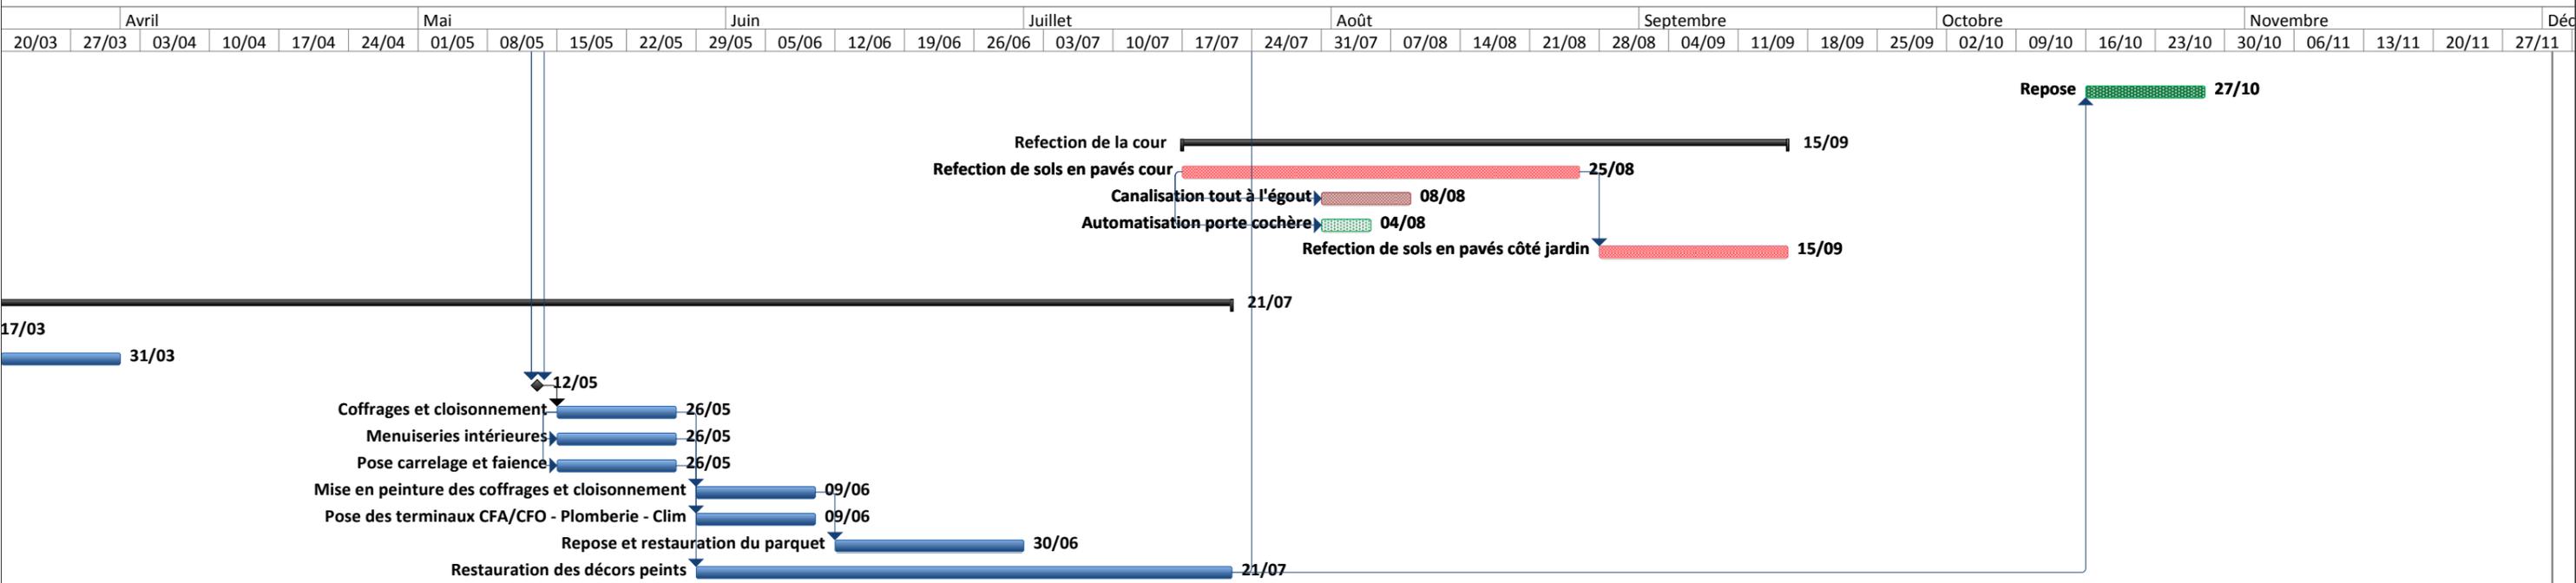

Projet : Planning M Date : Mer 26/10/1	Tâche	Lot 2	Lot 5	Lot 8	Lot 12	Lot 15	Lot 18	Lots 21/22	
	Recapitulative	Lot 3	Lot 6	Lot 9	Lot 13	Lot 16	Lot 19		
	Lot 1	Lot 4	Lot 7	Lots 10/11	Lot 14	Lot 17	Lot 20		
